

Goleszów dnia 21września 2012r..

## PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów z przeprowadzonej kontroli budowy chodnika dla pieszych , dwóch zjazdów oraz 11 miejsc postojowych ( parkingów) do przedszkola w Goleszowie wzdłuż ul. Grabowej .

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 23sierpnia do 21września 2012r. na podstawie planu pracy komisji na II półroczu 2012r.  
w następującym składzie osobowym :

1. Radna P. Janina Wantulok - przewodnicząca
2. Radny P. Karol Sojka z-ca
3. Radny P. Artur Więclaw - członek
4. Radny P. Leszek Szlauer -członek
5. Radny P. Bogusław Konecki – członek

### Opis stanu faktycznego:

1. Komisja udała się na miejsce realizacji tego zadania przy ul. Grabowej w Goleszowie . Przeprowadzono kontrolę merytoryczną polegającą na sprawdzeniu czy dokumenty są właściwie i dokładnie przedstawiają operację gospodarczą zgodną z jej rzeczywistym przebiegiem . Dokonano również pomiaru powykonawczego długości i powierzchni wykonanego chodnika którego szkic został załączony do protokołu.
2. Materiały kontrolne przedstawiali i wyjaśnień udzielali :
  - P. Zbigniew Kohut - Urząd Gminy Goleszów
  - P. Kazimierz Kubok -/Zakład Robót Drogowych/ ul. Tulipanów 7 Goleszów- wykonawca robót
3. Na budowę wydana została decyzja nr 2092 z dnia 02.12.2010r Starosty Powiatowego w Cieszynie zatwierdzająca projekt techniczny i udzielająca pozwolenia na budowę **WG-MB 7351/861/2010**
4. Na realizację tego zadania został ogłoszony przetarg w którym komisyjnie wybrano najtańszą ofertę firmy Zakładu Drogowego P. Kazimierza Kuboka z Goleszowa.  
/oferta według załącznika SIWZ na kwotę 116.235,0zł.brutto/.
5. Na wykonanie robót zawarto umowę z Urzędem Gminy w dniu 16 czerwca 2011r nr IZP-272.8.2011
6. Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę został wydany w dniu 16.06.2011r. dziennik budowy nr 1010 ,w którym na bieżąco dokonywano najważniejsze zapisy w okresie wykonywanych robót . Zawiadomiono również Organ Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót .
7. W trakcie budowy dokonywane były pewne zmiany w stosunku do projektu jak :  
zawężenie chodnika z szer. 2,0m do 1,65m , zmiany trasy końcowego odcinka w kierunku bramy na teren przedszkola , odwodnienia . Zmiany te były uzgadniane i wyjaśniane z Powiatowym Zarządem Dróg w Cieszynie z czego sporządzono notatki służbowe .

8. Roboty zanikające jak podbudowy były każdorazowo odbierane przez P. Jerzego Hławiczkę , bezusterkowo - /protokoły/.
9. Końcowy odbiór techniczny wykonanej budowy chodnika odbył się 15.09 2011r bezusterkowo. Na wykonane roboty udzielono 3 letniego okresu gwarancji .
10. Protokół odbioru zjazdów i miejsc postojowych został odebrany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie w dniu 14 marca 2012r również bezusterkowo.
11. Za wykonane roboty wystawiona została faktura WAT nr 89/11 z dnia 15.09.2011r. na kwotę **116.235,0zł. brutto**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono :

1. Rozbieżności w obmiarach powykonawczych powierzchni chodnika z kostki brukowej o 45m<sup>2</sup> zawyżonej w fakturze niezgodnej ze stanem faktycznym , co daje kwotę : 2025,0zł. netto . (załącznik)

Wnioski pokontrolne komisji :

1. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę , zgłosić budowę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o jej użytkowanie .
2. Udokumentować i wyliczyć wartość wykonanych robót dodatkowych na tym zadaniu dla zbilansowania kwoty 1800,0zł /netto/ wykazanej z tytułu rozbieżności rzeczywistej powierzchni wykonanego chodnika .

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony .

Na tym protokół zakończono i podpisano

załącznik : obmiar powykonawczy powierzchni chodnika

Podpisy osób kontrolujących :

1.....*Jamona*.....  
2.....*[signature]*.....


3.....*Wipura Adam*..... 5.....*Konecki*.....  
4.....*Szlaunow*.....

## CHODNIK ul. Grabowa do PRZEDSZKOLA w Goleszowie

### Długości :

$19,60\text{m} + 4,10\text{m} + 34,70\text{m} + 4,15\text{m} + 64,20\text{m} + 56,10\text{m} + 6,90\text{m} = \underline{189,75\text{mb.}}$

**Powierzchnia :**  $/19,6 + 4,10/ \times 1,60 + /34,70 + 4,15/ \times 1,67 + 64,20 \times 1,63 + 56,10 \times 1,65 + 6,90 \times 1,40 = \underline{309,66\text{m}^2}$

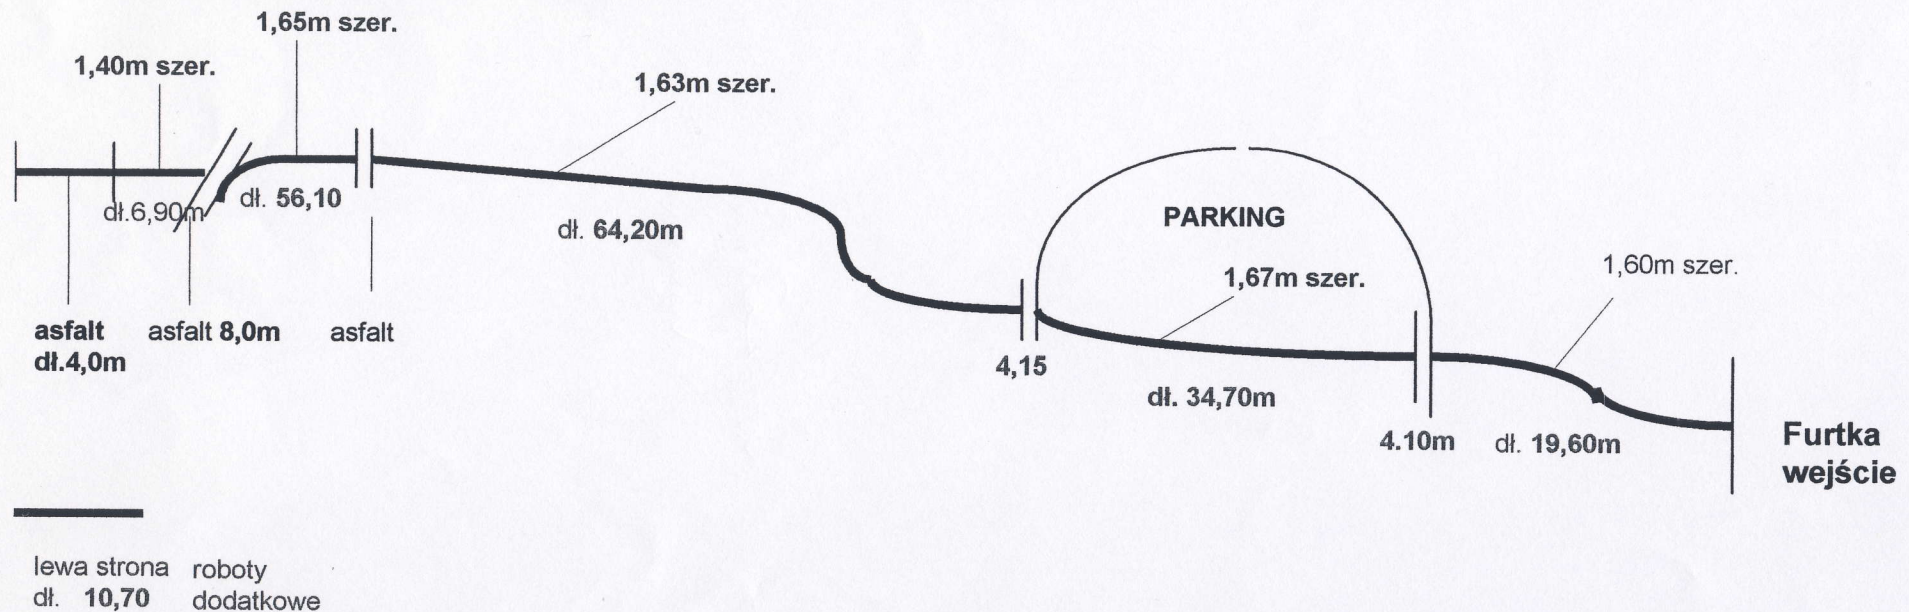

szkic bez skali  
pomiar wyk. : Karol Sojka 18.09.2012
