

Goleszów dnia 21 września 2012r..

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów z przeprowadzonej kontroli budowy chodnika dla pieszych, dwóch zjazdów oraz 11 miejsc postojowych (parkingów) do przedszkola w Goleszowie wzdłuż ul. Grabowej.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 23 sierpnia do 21 września 2012r. na podstawie planu pracy komisji na II półrocze 2012r. w następującym składzie osobowym:

1. Radna P. Janina Wantulok - przewodnicząca
2. Radny P. Karol Sojka - z-ca
3. Radny P. Artur Więclaw - członek
4. Radny P. Leszek Szlauer - członek
5. Radny P. Bogusław Konecki - członek

Opis stanu faktycznego:

1. Komisja udała się na miejsce realizacji tego zadania przy ul. Grabowej w Goleszowie. Przeprowadzono kontrolę merytoryczną polegającą na sprawdzeniu czy dokumenty są właściwie i dokładnie przedstawiają operację gospodarczą zgodną z jej rzeczywistym przebiegiem. Dokonano również pomiaru powykonawczego długości i powierzchni wykonanego chodnika którego szkic został załączony do protokołu.
2. Materiały kontrolne przedstawiali i wyjaśnień udzielali:
 - P. Zbigniew Kohut - Urząd Gminy Goleszów
 - P. Kazimierz Kubok - /Zakład Robót Drogowych/ ul. Tulipanów 7 Goleszów - wykonawca robót
3. Na budowę wydana została decyzja nr 2092 z dnia 02.12.2010r Starosty Powiatowego w Cieszynie zatwierdzająca projekt techniczny i udzielająca pozwolenia na budowę **WG-MB 7351/861/2010**
4. Na realizację tego zadania został ogłoszony przetarg w którym komisyjnie wybrano najtańszą ofertę firmy Zakładu Drogowego P. Kazimierza Kuboka z Goleszowa. /oferta według załącznika SIWZ na kwotę 116.235,0zł.brutto/.
5. Na wykonanie robót zawarto umowę z Urzędem Gminy w dniu 16 czerwca 2011r nr IZP-272.8.2011
6. Zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę został wydany w dniu 16.06.2011r. dziennik budowy nr 1010, w którym na bieżąco dokonywano najważniejsze zapisy w okresie wykonywanych robót. Zawiadomiono również Organ Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia robót.
7. W trakcie budowy dokonywane były pewne zmiany w stosunku do projektu jak: zawężenie chodnika z szer. 2,0m do 1,65m, zmiany trasy końcowego odcinka w kierunku bramy na teren przedszkola, odwodnienia. Zmiany te były uzgadniane i wyjaśniane z Powiatowym Zarządem Dróg w Cieszynie z czego sporządzono notatki służbowe.

8. Roboty zanikające jak podbudowy były każdorazowo odbierane przez P. Jerzego Hławiczkę , bezusterkowo - /protokoły/.
9. Końcowy odbiór techniczny wykonanej budowy chodnika odbył się 15.09 2011r bezusterkowo. Na wykonane roboty udzielono 3 letniego okresu gwarancji .
10. Protokół odbioru zjazdów i miejsc postojowych został odebrany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie w dniu 14 marca 2012r również bezusterkowo.
11. Za wykonane roboty wystawiona została faktura WAT nr 89/11 z dnia 15.09.2011r. na kwotę **116.235,0zł. brutto**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono :

1. Rozbieżności w obmiarach powykonawczych powierzchni chodnika z kostki brukowej o 45m2 zawyżonej w fakturze niezgodnej ze stanem faktycznym , co daje kwotę : 2025,0zł. netto . (załącznik)

Wnioski pokontrolne komisji :

1. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę , zgłosić budowę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o jej użytkowanie .
2. Udokumentować i wyliczyć wartość wykonanych robót dodatkowych na tym zadaniu dla zbilansowania kwoty 1800,0zł /netto/ wykazanej z tytułu rozbieżności rzeczywistej powierzchni wykonanego chodnika .

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony .
Na tym protokół zakończono i podpisano

załącznik : obmiar powykonawczy powierzchni chodnika

Podpisy osób kontrolujących :


1. Janina Wątrubka	3. Władysław Adam	5. Kowalski
2. [signature]	4. Jędrzejewski	

CHODNIK ul. Grabowa do PRZEDSZKOLA w Goleszowie

Długości :

$19,60\text{m} + 4,10\text{m} + 34,70\text{m} + 4,15\text{m} + 64,20\text{m} + 56,10\text{m} + 6,90\text{m} = \underline{189,75\text{mb.}}$

Powierzchnia : $/19,6 + 4,10/ \times 1,60 + /34,70 + 4,15/ \times 1,67 + 64,20 \times 1,63 + 56,10 \times 1,65 + 6,90 \times 1,40 = \underline{309,66\text{m}^2}$

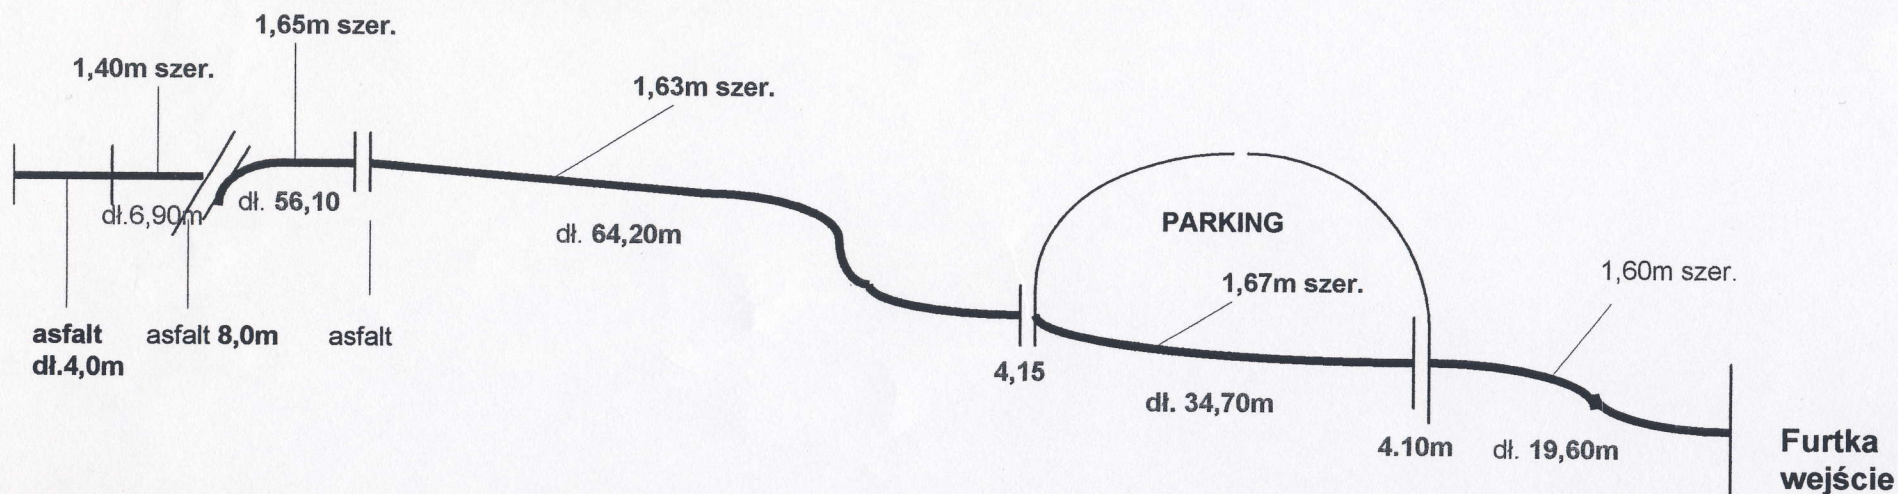

lewa strona roboty
dł. 10,70 dodatkowe

szkic bez skali
pomiary wyk. : Karol Sojka 18.09.2012
